



ДСНС
ОДЕЩИНИ

ЗВІТ ПРО ОПЕРАТИВНІ ДІЇ

Ліквідація пожежі на ТОВ «СПРУТ - ЛД»

Аналіз тактичних дій, розстановка сил
та хронологія гасіння (Ранг №3)

18 квітня 2026 року

Одеський район, Усатівська ТГ, вул. Київське шосе, 10 Б





ДСНС
ОДЕЩИНИ

Об'єкт та масштаб інциденту

Тип об'єкта
Виробничо-складський комплекс

Ступінь вогнестійкості
II (металопрофіль)

Склад №1 (15x100x3 м) та Склад №2 (32x100x3 м).
Стіни та покрівля — металопрофіль.

Пожежне навантаження: ЕКСТРЕМАЛЬНЕ

Висока щільність горючих матеріалів всередині складів та тисячі дерев'яних піддонів на відкритій території.

1 500 м²

Орієнтовна площа
на момент прибуття

5 000 м²

Максимальна площа
пожежі



ДСНС
ОДЕЩИНИ



Матриця оперативних ускладнень

[01. Відсутність води]

Всі 4 об'єктові пожежні гідранти виявилися без води. Найближчий робочий вуличний гідрант (ПГ-21) знаходився на критичній відстані — 5 км.

[02. Метеоумови]

Швидкість вітру сягала 11 м/с. Це створило ефект аеродинамічної труби між будівлями та сприяло миттєвому перекиданню полум'я.

[03. Вибухова небезпека]

Постійні поодинокі вибухи всередині складів (балони та аерозолі) становили пряму загрозу життю особового складу.

[04. Загроза обвалу]

Через екстремальні температури металопрофіль швидко втрачав несучу здатність, що призвело до масштабної деформації та обвалення.

Залучені сили та засоби

Загальне угруповання

77

осіб особового складу

23

одиниці техніки

З них від ДСНС

69

осіб особового складу

20

одиниць техніки

Основна техніка: 9 од.

Включаючи автомобілі для підвозу води

Спеціальна техніка: 7 од.

АШ, ПНС, 2х АГДЗС, АР, РХБЗ, Автомобіль БпЛА

Взаємодіючі служби: ЕМД, Патрульна поліція, Аварійна газова служба,
Аварійна РЕМ, МПК «Нерубайське», КУ РВС.

[14:04 - 14:14]



ДСНС
ОДЕЩИНИ

Фаза 1: Прибуття, розвідка та оцінка

Тактичний чек-ліст: Дії КГП-1

- **14:05** Прибуття КГП-1. Негайне підтвердження пожежі за «Рангом №3».
- **14:05** Фіксація множинних осередків горіння (Склад №1, Склад №2, дерев'яні піддони).
- **14:08** Проведення розвідки вододжерел.
Критичне відкриття: повна відсутність води в 4-х об'єктових ПГ.
- **14:14** Організація безперебійного підвозу води. Введення в роботу перших стволів «СПРК» та формування ланок ГДЗС.



[illegible]

Схема демонструє початкову розстановку сил і засобів підрозділів, напрям вітру та прокладання перших ліній подачі води в умовах відсутності водопостачання в об'єктовій водомережі

[14:26 - 14:39]



ДСНС
ОДЕЩИНИ

Ескалація та Тактичний Маневр: Дії КГП-1

Організація управління

Створено Штаб пожежогасіння.
Розподіл на 2 оперативні дільниці:
ОД-1: гасіння складських приміщень.
ОД-2: гасіння дерев'яних піддонів.

Критична ситуація

Через екстремальну температуру та поодинокі вибухи почалася невідворотна деформація та обрушення несучих конструкцій складу.

Зміна тактики

Рішення КГП-1:
Негайне відведення всіх ланок ГДЗС зсередини будівлі.
Перехід на зовнішнє гасіння по драбинах для збереження життів.



[14:51 - 15:09]



ДСНС
ОДЕЩИНИ

Фаза 2: Передача керівництва та нарощування сил

дії КГП-2 (Керівництво ГУ ДСНС)

14:51

Прибуття керівного складу ГУ ДСНС. Перебирання управління (КГП-2) та повторне підтвердження вищого рангу пожежі.

Масштаб загрози

Фронт вогню збільшився до 5 000 м²:

- Склад №1 (1 500 м²)
- Склад №2 (3 000 м²)
- Відкриті піддони (500 м²)

Ударне угруповання

Введено в роботу 10 ручних стволів «СПРК»:

- 7 стволів працюють безпосередньо на гасіння складів.
- 3 стволи залучені на захист прилеглої території від перекидання вогню.

Оперативна обстановка на момент прийняття управління КГП-2

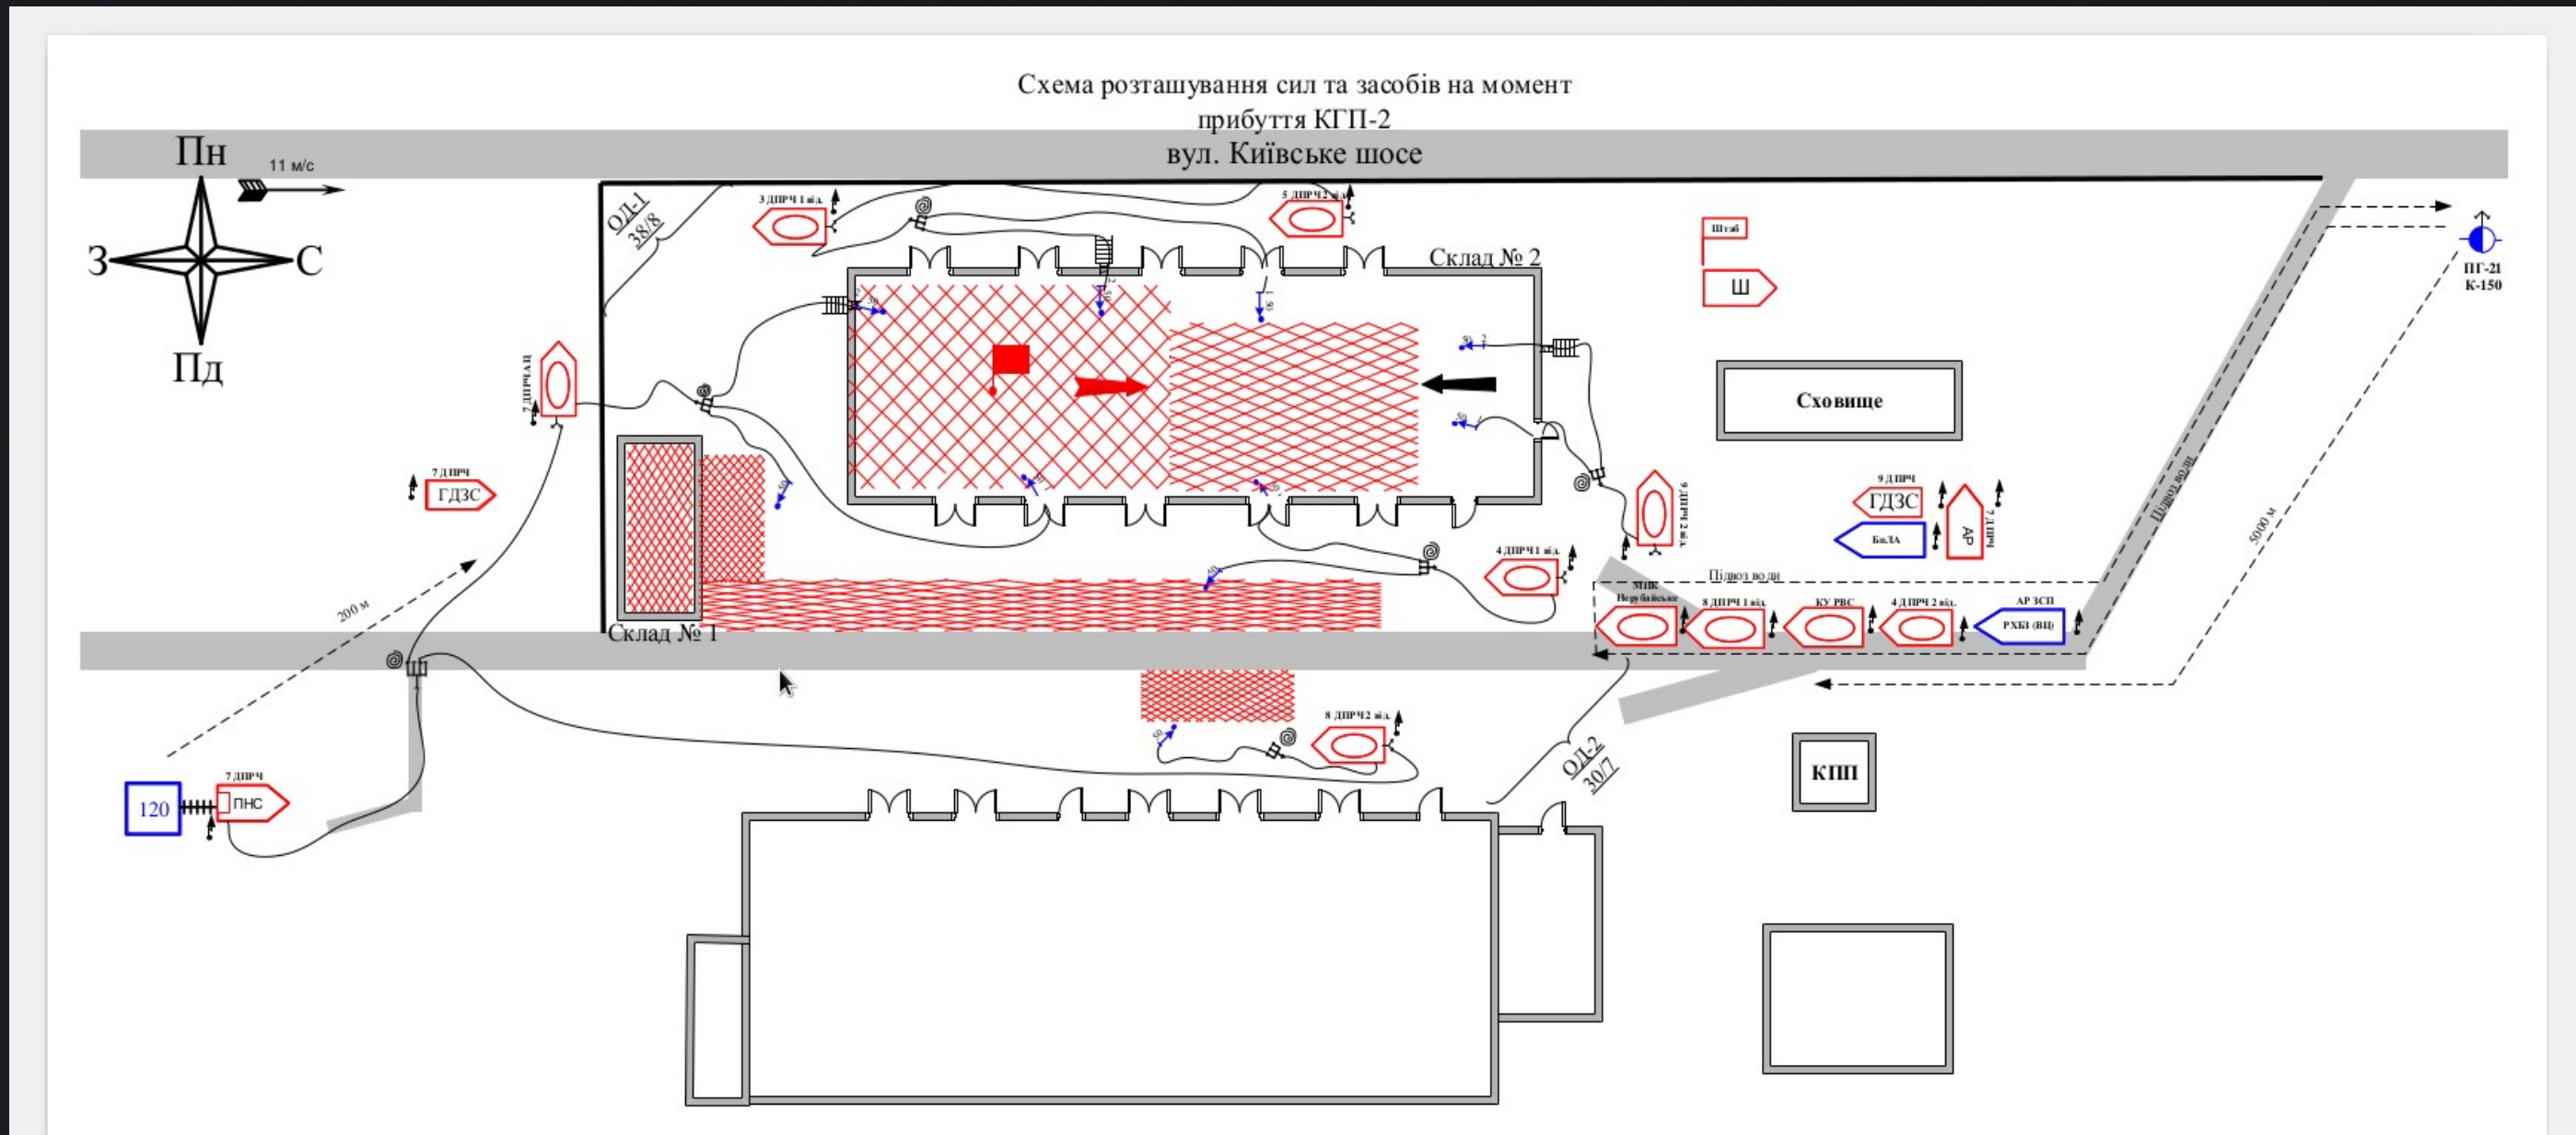


Схема демонструє максимальне розширення площі горіння (5000 метрів квадратних).
Відображено залучення всіх резервів та організовану безперебійну подачу води,
що стало ключовим фактором стабілізації

[15:38]

Фаза 3: Локалізація пожежі

Зупинка розповсюдження вогню

Час локалізації

15:38

Площа локалізації

5 000 м²

Тактичний результат

Завдяки жорсткому розподілу сил по ОД-1 та ОД-2 і стабілізації підвозу води з ПГ-21 (за 5 км), фронт полум'я було зупинено. Загрозу перекидання на сусідні виробничі об'єкти повністю знято.






ДСНС
ОДЕЩИНИ

Схема локалізації пожежі

Схема розташування сил та засобів на момент
локалізації
вул. Київське шосе

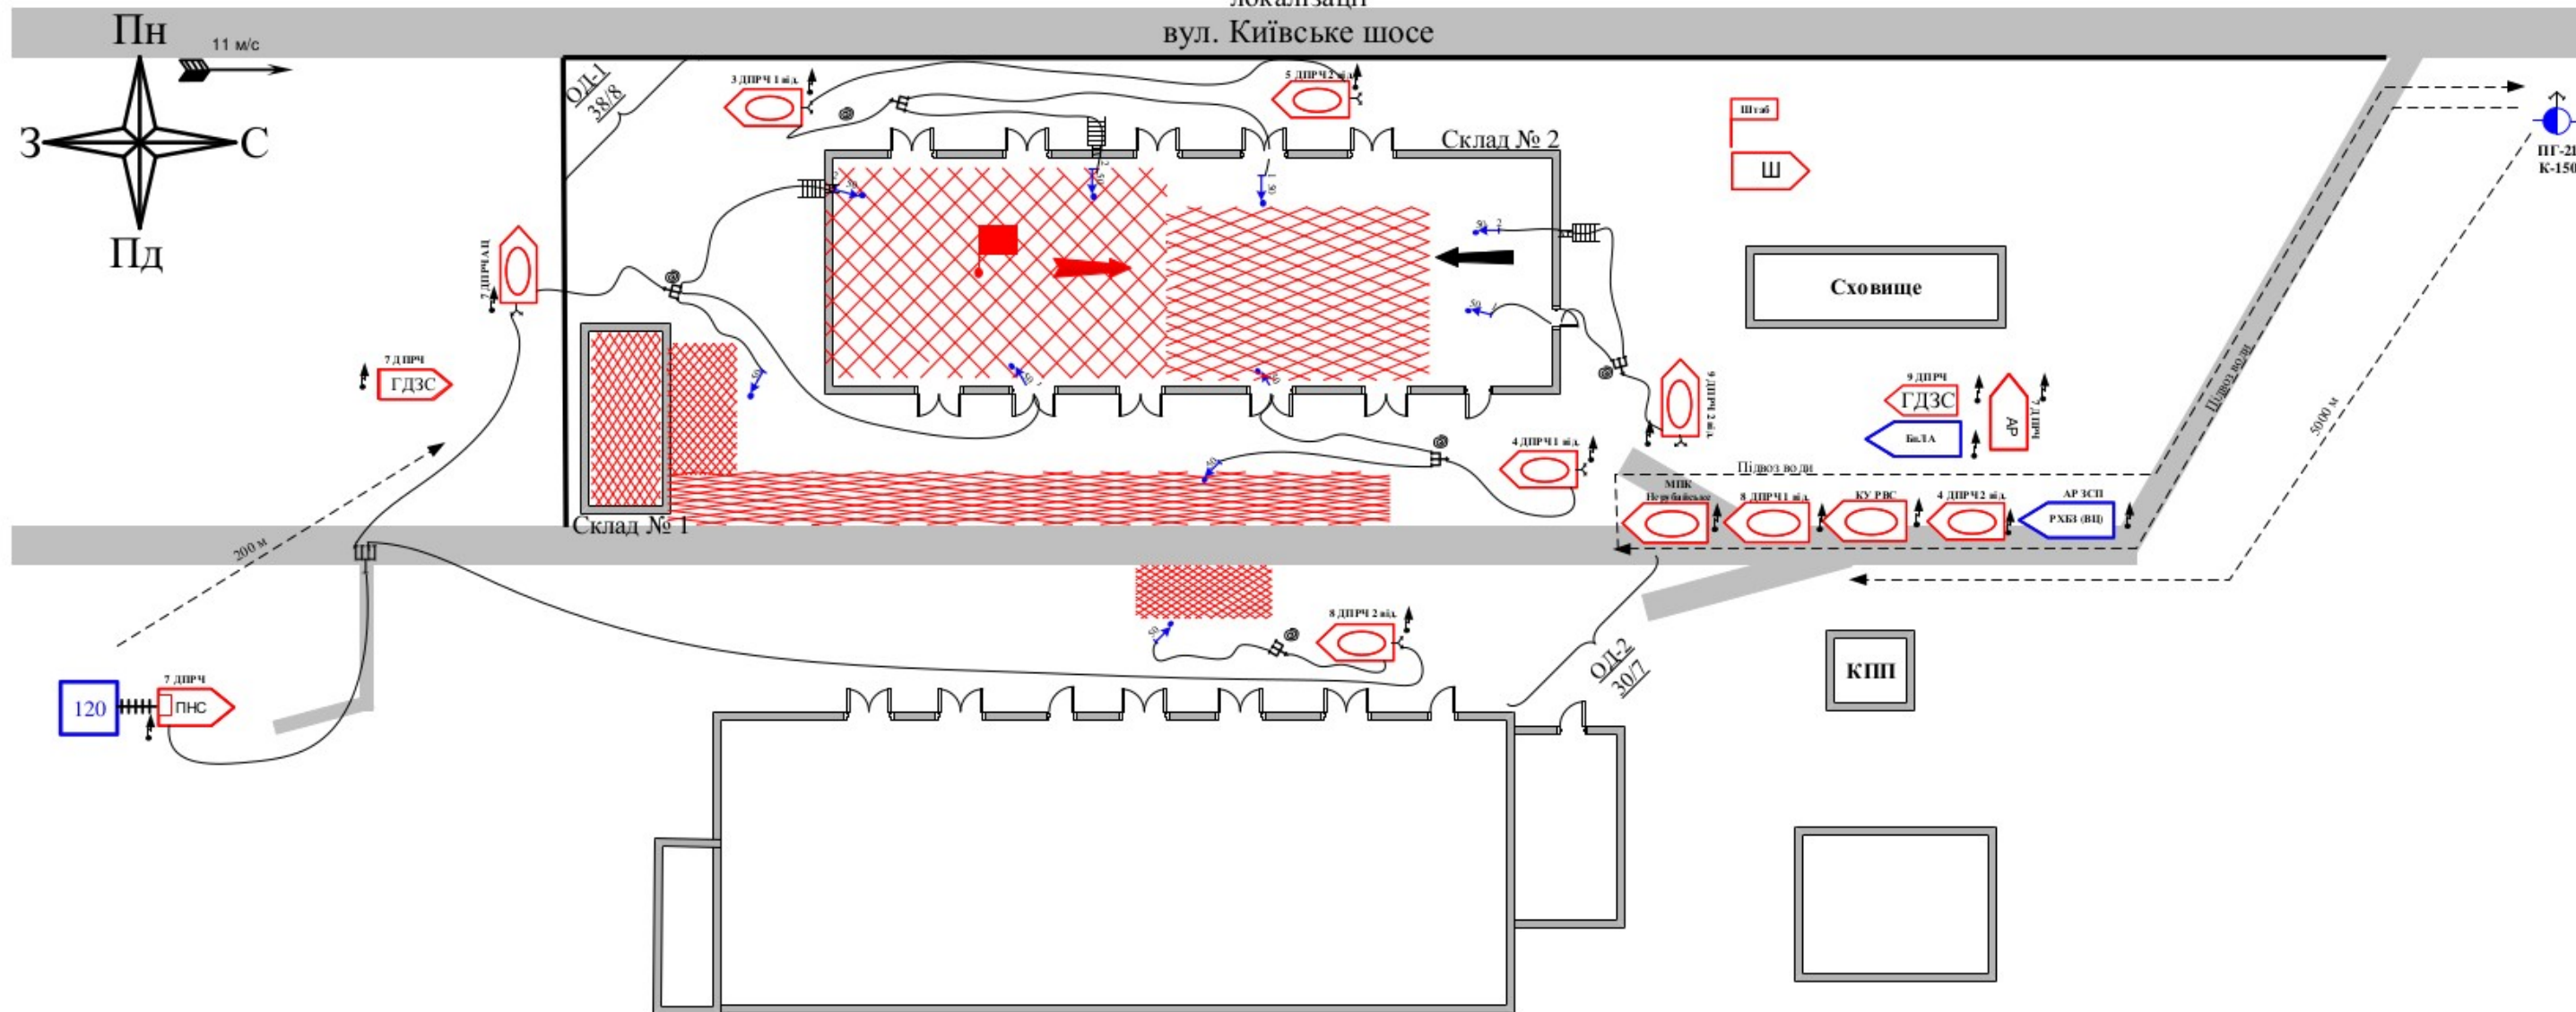

Зафіксовано повне оточення осередків горіння. Усі 10 водяних ручних стволів працюють на утримання периметра та пригнічення інтенсивності полум'я.



[16:22]



ДСНС
ОДЕЩИНИ

Фаза 4: Повна ліквідація

Розбирання конструкцій та проливка

Час ліквідації: 16:22

Площа ліквідації: 5 000 м²

Фінальні дії


Проведення масштабних робіт з розбирання обвалених металевих конструкцій та ретельна проливка прихованих осередків горіння під завалами.

Завершення операції

Організація чергування. Повне повернення підрозділів у розташування відбулося о 08:11 наступного ранку.

Фінальна схема на момент ліквідації

Схема розташування сил та засобів на момент
ліквідації
вул. Київське шосе

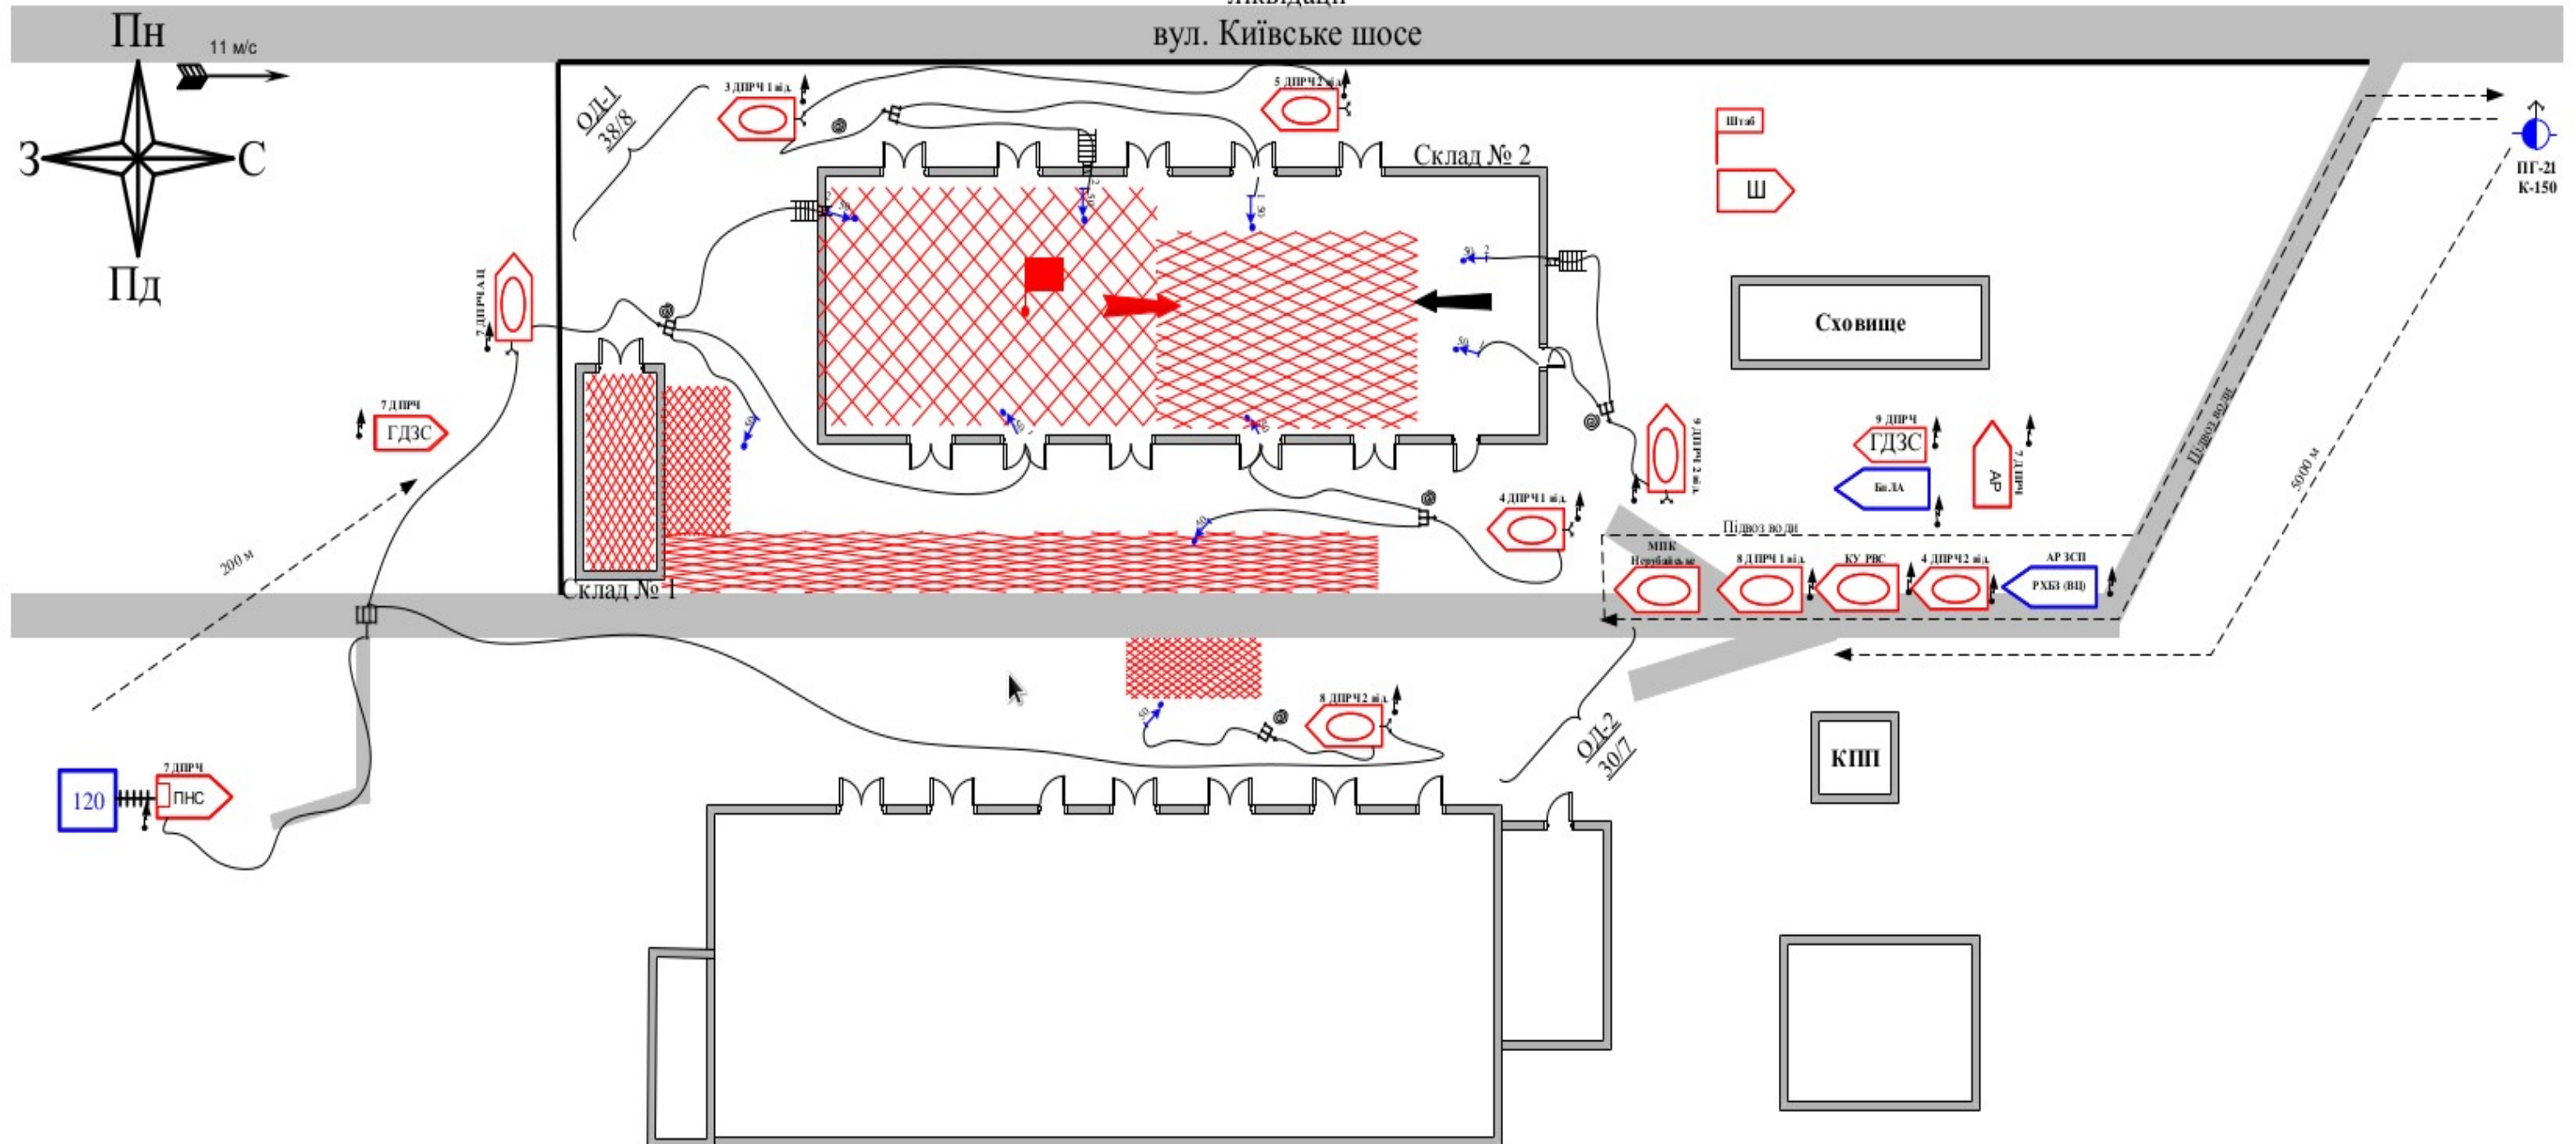



ДСНС
ОДЕЩИНИ

Підсумки

Успішна ліквідація надзвичайно складної пожежі в умовах сильного вітру, відсутності водопостачання та постійної загрози вибуху і руйнування конструкцій стала можливою завдяки швидкій організації водопостачання, грамотному розподілу сил і засобів, а також бездоганній координації між КГП, штабом пожежогасіння та оперативними дільницями.

0

**Жертви /
Травмовані**

Завдяки своєчасному наказу КГП-1 про відведення о/с, під час обвалу ніхто з рятувальників не постраждав.

0

**Втрати
техніки ДСНС**

Одиниць

1 будівля

Врятовано майна

Не допущено знищення суміжного комплексу.

50000 м²

Знищено вогнем

1 комплекс складів повністю вигорів.
