ДОПОВІДЬ
про сили, засоби та результати дій піротехнічного розрахунку частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування АРЗ СП ГУ ДСНС України в Одеській області під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з ворожим обстрілом Одеського припортового заводу, що виникла 11 квітня 2026 року в Одеській області

1. Загальна інформація та реагування на заявку.

11.04.2026 року о 04:23 на пункт оперативного зв'язку аварійно-рятувального загону спеціального призначення надійшла заявка щодо залучення піротехнічного підрозділу для проведення робіт з розмінування та знешкодження (знищення) виявлених вибухонебезпечних предметів на території Пересипського району міста Одеси, за адресою - м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. 144, ПАТ "Одескабель", виробничий цех №2.

Керуючись Наказом ДСНС України від 04.06.2026 № 803 «Порядок оперативного реагування територіальних органів і підрозділів центрального підпорядкування на повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів, виконання водолазних пошуково-рятувальних та інших спеціальних робіт на водних об'єктах», у зв'язку із виявленням ВНП у місці з масовим перебуванням людей, на потенційно небезпечному об'єкті, заявка виконується позачергово.

На виконання заявки залучено 5 чоловік особового складу частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування, 2 одиниці техніки (ОПМ SSANG YONG Musso Grand та ПМ-Л FORD F550-Козак), для медичного супроводу залучено 1 чоловік медико-санітарної частини.

Керівник робіт перед початком виконання робіт зі знешкодження ВНП перевіряє справність засобів радіозв'язку, наявність в особового складу засобів бронезахисту, індивідуальних аптечок та джгутів, а також наявність і якість радіозв'язку з особовим складом та медичним працівником.

Після прибуття до місця виконання завдання керівник робіт визначив тип і категорію ВНП — БпЛА «Герань-2» з осколочно-фугасно-запалювальною бойовою частиною І категорії, визначив необхідні заходи безпеки під час виконання завдань.

Керівник робіт:

Поставив завдання кожній особі розрахунку.

Проінструктував особовий склад про дотримання заходів безпеки.

Визначив місця розміщення техніки, приладів та обладнання, тимчасово зберігання ВНП.

Забезпечив відсутність сторонніх осіб у районі проведення робіт на наявність ВНП.

2. Обстеження, транспортування та знищення.

Суцільна забудова унеможливлює проведення обстеження ділянки місцевості на наявність ВНП. В акті виконаних робіт із знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів зазначено що обстеження не проводилось, у зв'язку із суцільною забудовою.

Після ідентифікації та визначення категорії, було організовано вилучення ВНП на місце тимчасового зберігання для подальшої підготовки до транспортування до місця знищення.

Для транспортування виявленого ВНП залучено ПМ-Л FORD F550-Козак, під час завантаження кількість особового складу біля автомобіля мінімальна.

Маршрут проходження автомобілів, що перевозять ВНП, був обраний таким чином, щоб виключити рух через населені пункти та рухатися об'їзними шляхами також вибрано вулиці для проїзду з найменш інтенсивним рухом транспорту.

По прибуттю до місця знищення керівник робіт – приймає рішення, ставить задачі та інструктує особовий склад, здійснює загальне керівництво і контроль

При електричному способі підривання виконано такі заходи безпеки:

електродетонатори вставлені у відкриті заряди безпосередньо перед здійсненням вибуху за наказом керівника робіт;

до закінчення робіт з установки електродетонаторів у заряди і відходу особового складу на безпечну відстань (в укриття) джерело струму до магістрального дроту не підключати;

джерела струму (підривні машинки, батареї) утримуються у керівника робіт і видані підривникам безпосередньо перед вибухом;

перед підключенням омметра до мережі, для перевірки останньої, спочатку перевірена його справність;

перевірку електричних мереж омметром проводиться тільки після віддалення усіх людей від місця розташування зарядів;

кінці магістральних дротів на станції тримати ізольованими з підв'язаними до них табличками з позначеннями, від якої групи зарядів вони йдуть;

перед здійсненням вибуху і відходу всіх підривників в укриття подавати команду: «Приготуватися!»;


по цій команді кінці магістральних дротів приєднуються до машинки, підривна машинка заряджається;

після перевірки виконання команди подати команду (сигнал) «Вогонь!», по якій натиском кнопки «ВИБУХ» провести вмикання підривної машинки в електровибухову мережу;

Випадків підриву, загибелі, поранень людей не допущено, ушкоджень, заподіяних суб'єктам господарювання, не завдано

По завершенню вибухових робіт подано команду «Відбій», після чого особовий склад, техніка та обладнання приведені у готовність до подальшого використання та повернулися до пункту постійної дислокації.



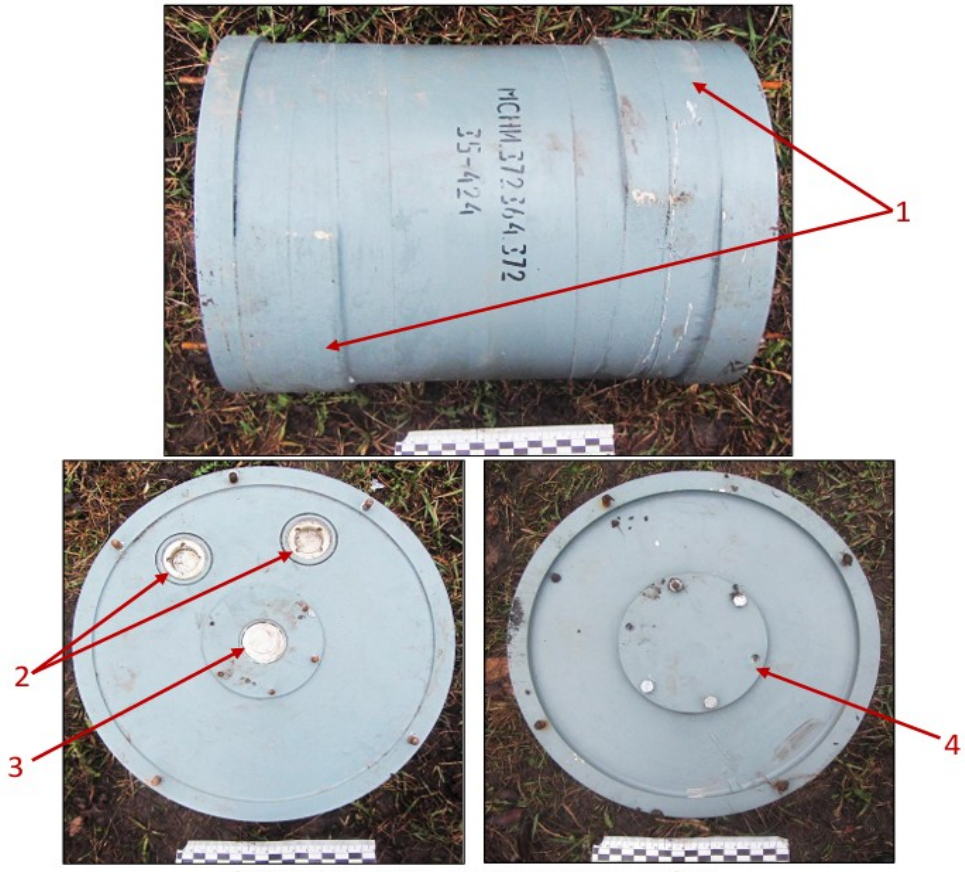

Зображення 23-25. Бойова частина «БСФ».

1-смуги з готовими уражаючими елементами, 2- стакани з гермоелементами, 3-детонатор, 4-заливна горловина.
